

## **Stand der Investitionsrechnung 2023 per 30. April 2023 (Realisierungsgrad)**

### **1 AUSGANGSLAGE**

Der Grosse Gemeinderat hat am 17. November 2020 der überparteilichen Motion (EVP, forum, Grüne und SP) "Realisierungsgrad von Investitionen nachhaltig steigern" zugestimmt. Mit der Jahresrechnung wird dem Parlament jährlich Rechenschaft über die getätigten Investitionen und damit auch über den Realisierungsgrad abgelegt.

Der Grosse Gemeinderat hat den Gemeinderat zusätzlich beauftragt, jeweils in den Monaten Mai und Oktober über den Stand der Investitionen zu informieren.

### **2 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PER 30. APRIL 2023**

Im Investitionsplan 2023<sup>1</sup> sind Gesamtinvestitionen von CHF 11,4 Mio. vorgesehen. Bis Ende März 2023 sind insgesamt CHF 1,3 Mio. zu Lasten der Investitionsrechnung verbucht worden.


Gemäss der neuesten Prognose geht der Gemeinderat davon aus, dass per Ende 2023 insgesamt CHF 8,3 Mio. verbucht sein werden. **Der Realisierungsgrad würde somit rund 75 % (Rechnung 2022: 53 %) betragen.**

### **3 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PRO SACHGRUPPE PER 30. APRIL 2023**

Die Entwicklung der verschiedenen Sachgruppen sieht aktuell wie folgt aus:


---

<sup>1</sup> [http://www.muri-guemligen.ch/fileadmin/muriguemligench/02\\_Verwaltung/Finanzen\\_und\\_Steuern/Investitionsplan\\_2022\\_-\\_2027\\_GGR\\_25.10.2022.pdf](http://www.muri-guemligen.ch/fileadmin/muriguemligench/02_Verwaltung/Finanzen_und_Steuern/Investitionsplan_2022_-_2027_GGR_25.10.2022.pdf)

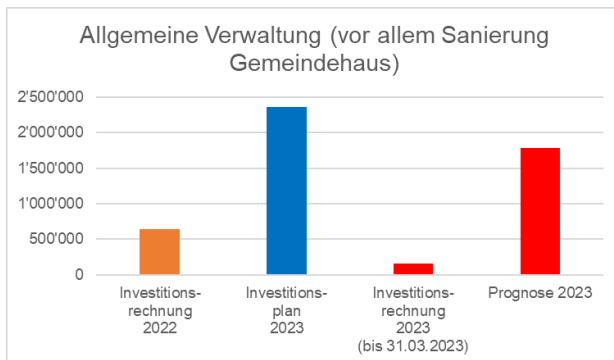


### Allgemeine Verwaltung (vor allem Sanierung Gemeindehaus):

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan um CHF 570'000 unterschritten werden. Die Prognose basiert auf dem aktuellen Zahlungsplan des Bauprojektes Sanierung Gemeindehaus.

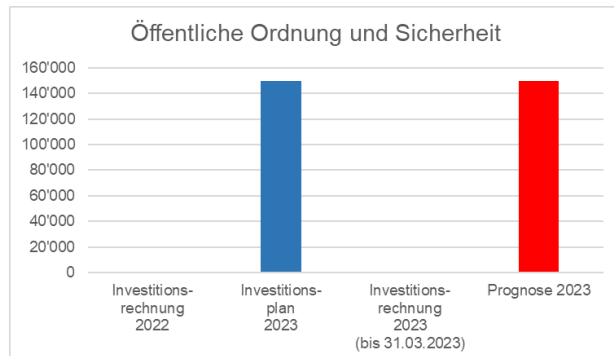

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Im Investitionsplan ist die Ersatzbeschaffung von Brandschutzausrüstungen für die Feuerwehr vorgesehen (Spezialfinanzierung). Derzeit gehen wir davon aus, dass diese gemäss Plan beschafft wird.

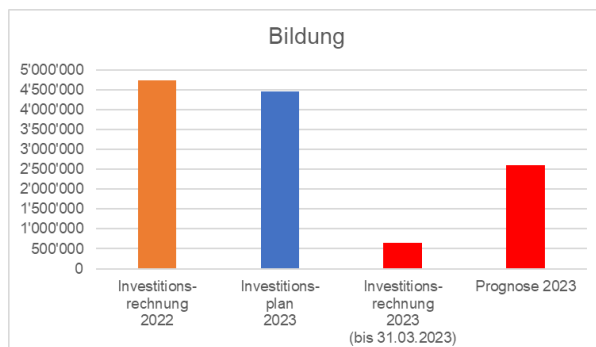


### Bildung:

Der Investitionsplan dürfte um rund CHF 1,9 Mio. unterschritten werden.

Die folgenden Vorhaben (Hauptabweichungen) können teilweise erst später umgesetzt werden:

- Melchenbühl; Sanierung und Erweiterung: CHF 0,5 Mio.
- Umbau Beleuchtung auf LED: CHF 0,7 Mio.
- Schulstrasse 6; Umnutzung für Tagesschule: CHF 0,3 Mio.
- Horbern, Rainweg 11 Tagesschule: CHF 0,2 Mio.

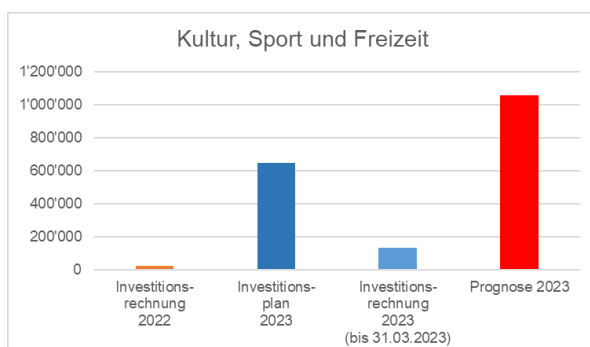


### Kultur, Sport und Freizeit:

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan um CHF 411'000 überschritten werden.

Im Aarebad werden folgende, dringende Investitionen früher als geplant umgesetzt:

- Ersatz Belagsflächen (Verbundsteine): CHF 235'000
- Technik und Filteranlage: CHF 105'000
- Sicherheitsmassnahmen an Anlagen: CHF 70'000
- Beschattung Kinderbassin etc.: CHF 53'000

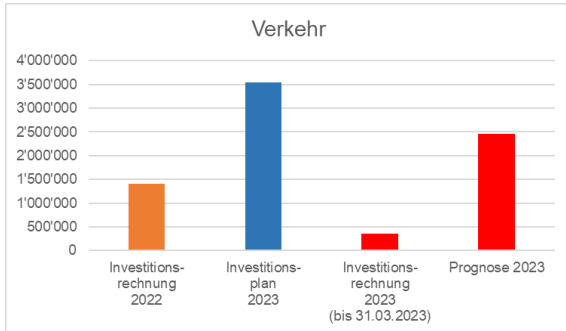

#### Verkehr:


Die Prognose liegt derzeit um CHF 1,1 Mio. unter dem Investitionsplan.

Folgende Investitionen erfolgen erst ab dem Jahr 2024 (Minderinvestitionen von CHF 0,8 Mio.):

- Sanierung Bersetweg
- Tannenweg
- Dr. Haasstrasse.

Der Umbau der Leuchtmittel hat sich verzögert und kann frühestens im Jahr 2024 begonnen werden (geringere Investitionen im 2023 von CHF 0,5 Mio.).

Die Belagssanierung im Strassenbau erfolgt jeweils nach Abschluss der Arbeiten der Gemeindebetriebe Muri (GBM) und steht in direkter Abhängigkeit der Planung

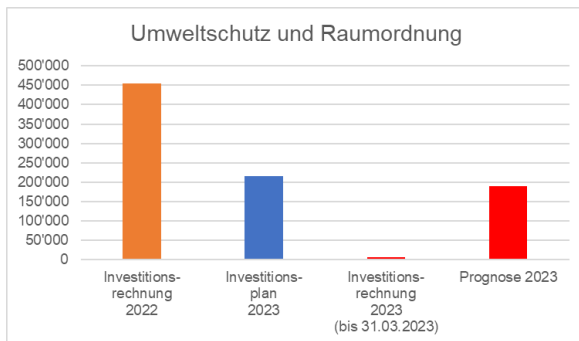

#### Umweltschutz und Raumordnung:

In der Sachgruppe wird mit Investitionen gemäss Plan ausgegangen.

## 4

### ANTRAG

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

### Beschluss

zu fassen:

Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Investitionsrechnung 2023 per Ende April 2023.

Muri bei Bern, 1. Mai 2023

GEMEINDERAT MURI BEI BERN  
Der Präsident                      Die Sekretärin

Stephan Lack                      Corina Bühler
