

Stand der Investitionsrechnung 2024 (Realisierungsgrad)

1 AUSGANGSLAGE

Mit der Jahresrechnung wird dem Parlament jährlich Rechenschaft über die getätigten Investitionen und damit auch über den Realisierungsgrad abgelegt.

Der Grosse Gemeinderat hat den Gemeinderat zusätzlich beauftragt, jeweils in den Monaten Mai und Oktober über den Stand der Investitionen zu informieren.

2 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG


Im Investitionsplan 2024¹ sind Gesamtinvestitionen von rund CHF 23 Mio. vorgesehen. Bis Ende August 2024 sind insgesamt **CHF 6,4 Mio.** zu Lasten der Investitionsrechnung verbucht worden.

Gemäss der neuesten Prognose geht der Gemeinderat davon aus, dass per Ende 2024 insgesamt rund CHF 20,3 Mio. verbucht sein werden. **Der Realisierungsgrad würde somit 87 % (Rechnung 2023: 62 %) betragen**, insofern die Rechnungsstellung im 2024 erfolgt. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist zu erwähnen, dass sich im Jahr 2024 mit dem Gemeindehaus und der Schulanlage Melchenbühl inkl. der Containerschule zwei Grossinvestitionen im Bau befinden.

3 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN


Die Entwicklung nach der funktionalen Gliederung sieht aktuell wie folgt aus:

¹ https://www.muri-guemligen.ch/public/upload/assets/429/20231124%20_Investitionsplan_2023-2028.pdf?fp=2

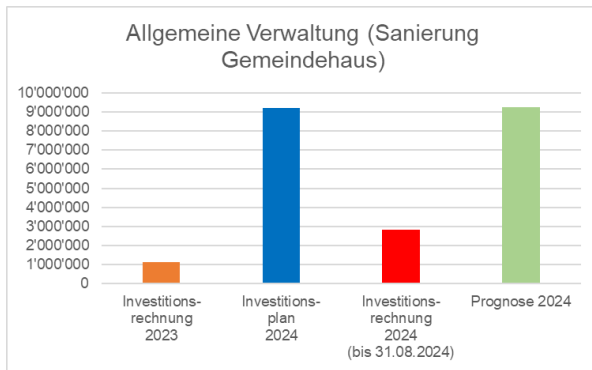


Allgemeine Verwaltung (Sanierung Gemeindehaus):

Die Prognose basiert auf dem aktuellen Zahlungsplan des Bauprojektes "Sanierung Gemeindehaus". Die Bauarbeiten verlaufen derzeit plangemäss, weshalb die Prognose dem Plan entspricht.

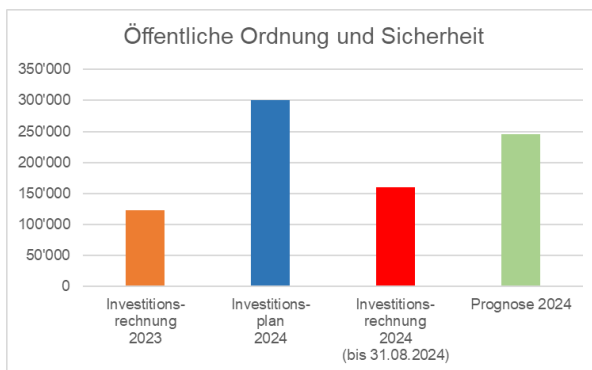

Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Im Investitionsplan ist die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr vorgesehen (Spezialfinanzierung). Für das Fahrzeug sind bereits Teilrechnungen beglichen worden.

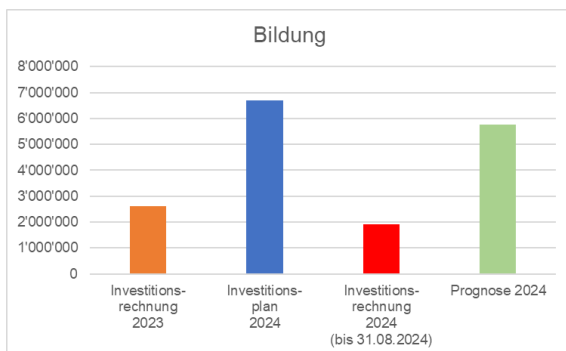


Bildung:

Der Investitionsplan dürfte um rund CHF 1 Mio. unterschritten werden.

Die spätere Umsetzung folgender Vorhaben (Hauptabweichungen) führen zur Unterschreitung:

- Umbau Beleuchtung Schulanlagen auf LED CHF 0,9 Mio.
- Umnutzung Rainweg 11 zur Tagesschule CHF 0,3 Mio.

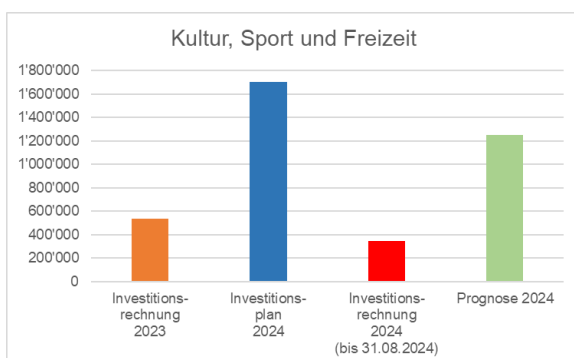


Kultur, Sport und Freizeit:

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan um rund CHF 450'000 unterschritten werden.

Die spätere Umsetzung folgender Vorhaben (Hauptabweichungen) führen zur Unterschreitung:

- Umbau Beleuchtung Bibliothek CHF 0,1 Mio.
- Oblichter Garderoben SZ Füllerich CHF 0,1 Mio.
- Pumptrack CHF 0,2 Mio.

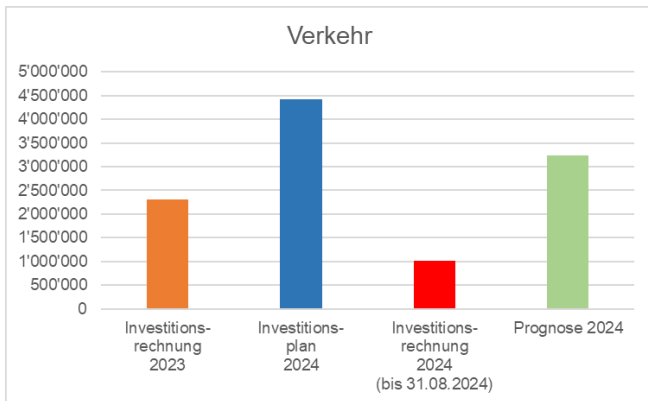


Verkehr:

Die Prognose liegt derzeit um CHF 1,2 Mio. unter dem Investitionsplan. Folgende Investitionen erfolgen frühestens ab dem Jahr 2025:

- Sanierung Egghölzliweg
- Sanierung Tannenweg
- Sanierung Tannackerstrasse
- Sanierung Breichtenstrasse
- Sanierung Kräyigenweg

Die Belagssanierung im Strassenbau erfolgt jeweils nach Abschluss der Arbeiten der Gemeindebetriebe Muri (gbm) und steht in direkter Abhängigkeit der Planung der gbm. Trotz der tieferen Investitionen im Jahr 2024 wird von keinem Investitionsstau ausgegangen.

Weiter wurde die Strassenwischmaschine des Werkhofes umfassend revidiert, weshalb diese später als geplant ersetzt werden kann.

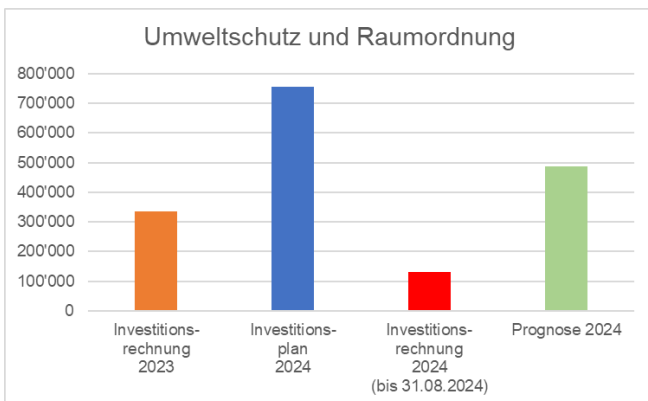

Umweltschutz und Raumordnung:

In der Funktion wird mit einer Unterschreitung der Investitionen von CHF 270'000 ausgegangen.

Die Unterschreitung ist auf folgende Vorhaben der Raumplanung und zugunsten des Friedhofsgebäudes zurückzuführen:

- Entwicklung Tannental CHF 70'000
- Sardi Nord CHF 40'000
- Uferschutzplan CHF 25'000
- Friedhofsgebäude Ersatz Technik CHF 120'000

4

ANTRAG

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Investitionsrechnung 2024.

Gümligen, 2. September 2024

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident Die Sekretärin

Stephan Lack Corina Bühler
