

Stand der Investitionsrechnung 2025 (Realisierungsgrad)

1 AUSGANGSLAGE

Mit der Jahresrechnung wird dem Parlament jährlich Rechenschaft über die getätigten Investitionen und damit auch über den Realisierungsgrad abgelegt.

Der Grosse Gemeinderat hat den Gemeinderat zusätzlich beauftragt, jeweils in den Monaten Mai und Oktober über den Stand der Investitionen zu informieren.

2 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG


Im Investitionsplan 2025¹ sind Gesamtinvestitionen von rund CHF 20,3 Mio. vorgesehen. Bis Ende März 2025 sind insgesamt **CHF 4,2 Mio.** zu Lasten der Investitionsrechnung verbucht worden.

Gemäss der neuesten Prognose geht der Gemeinderat davon aus, dass per Ende 2025 insgesamt rund CHF 18 Mio. verbucht sein werden. **Der Realisierungsgrad würde somit 88 % (Rechnung 2024: 65 %) betragen**, insofern die Rechnungsstellung im 2025 erfolgt.

3 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN


Die Entwicklung nach der funktionalen Gliederung sieht aktuell wie folgt aus:

¹ https://www.muri-guemligen.ch/public/upload/assets/4984/20250211_Investitionsplan_2024-2029_definitiv.pdf?fp=1

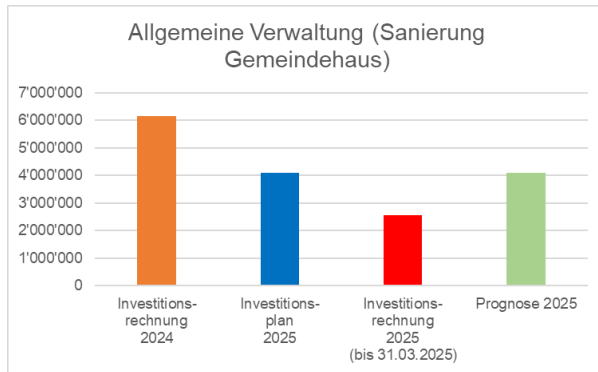


Allgemeine Verwaltung (Sanierung Gemeindehaus):

Die Prognose basiert auf dem aktuellen Zahlungsplan des Bauprojektes "Sanierung Gemeindehaus". Die Bauarbeiten verlaufen plangemäss und stehen kurz vor dem Abschluss, weshalb die Prognose dem Plan entspricht.

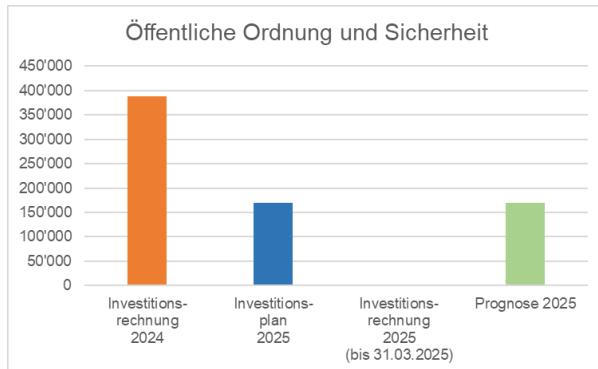

Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Im Investitionsplan ist die Instandsetzung der Wasserführung in der Umgebung der Schiessanlage und der Umbau der Beleuchtung auf LED im Schützenhaus vorgesehen.

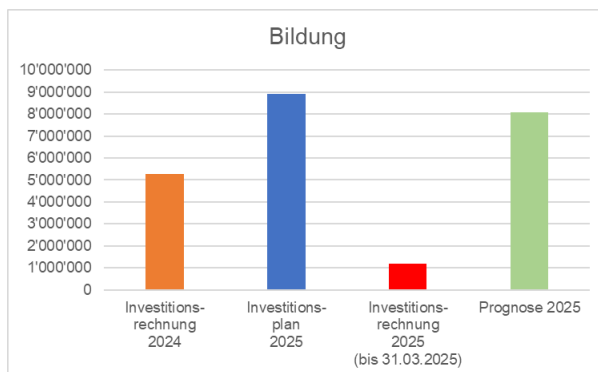


Bildung:

Der Investitionsplan dürfte um rund CHF 0,84 Mio. unterschritten werden.

Die Unterschreitung ist hauptsächlich auf die Verschiebung der Neugestaltung des Aussenraums bei der Schulanlage Moos zurückzuführen (CHF 0,4 Mio.). Der Grosse Gemeinderat hat am 18. März 2025 mit 21 zu 19 Stimmen beschlossen, nicht auf das Geschäft einzutreten.

Weiter wird der Hauptteil der Gesamtanierung des Pausenplatzes der Schulanlage Aebnit erst im Jahr 2026 realisiert werden.

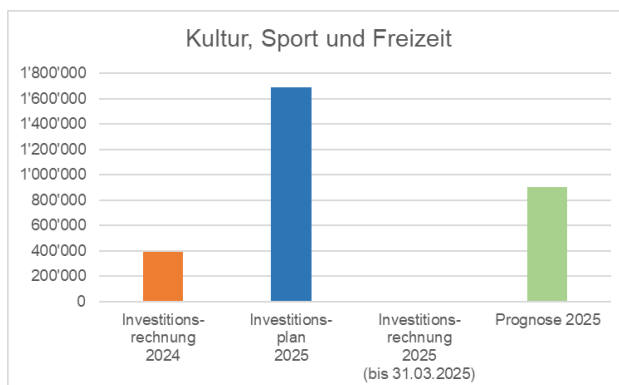


Kultur, Sport und Freizeit:

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan um rund CHF 790'000 unterschritten werden.

Die spätere Umsetzung folgender Vorhaben (Hauptabweichungen) führt zur Unterschreitung:

- Sportzentrum Füllerich, Oblicher Garderobentrakt CHF 0,12 Mio.
- Sportzentrum Füllerich, Umbau Beleuchtung Aussen CHF 0,5 Mio.
- Pumptrack CHF 0,2 Mio. (offene Baubewilligung)

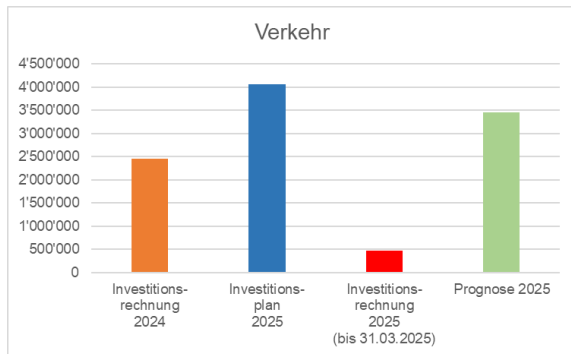

Verkehr:

Die Prognose liegt derzeit um CHF 0,6 Mio. unter dem Investitionsplan. Folgende Investitionen erfolgen frühestens oder mehrheitlich erst ab dem Jahr 2026:

- Sanierung Portalésstrasse
- Sanierung Breichenstrasse
- Ausbau Fernwärmenetz; Diverse Strassenabschnitte

Die Belagssanierung im Strassenbau erfolgt jeweils nach Abschluss der Arbeiten der Gemeindebetriebe Muri (gbm) und steht in direkter Abhängigkeit der Planung der gbm.



Umweltschutz und Raumordnung:

In der Funktion wird mit einer Unterschreitung der Investitionen von CHF 118'000 ausgegangen.

Die Unterschreitung ist auf folgende Vorhaben zurückzuführen:

- Entwicklung Tannental CHF 50'000
- Neuer Turm für Glocke (aus Melchenbühl) CHF 40'000

4

ANTRAG

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Investitionsrechnung 2025.

Gümligen, 14. April 2025

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident

Die Gemeindeschreiberin

Jan Köbeli

Karin Pulfer
